Sekretess: Intern

BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Centralbyggnaden Incheckningsdisk: 78**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori **Elektronisk**		**Serienr** **1305L10/664**
Fabrikat Flintab	**Modell** **47-10**	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod **Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0			
10,0	10			
20,0	20			
30,0	30			
40,0	40			

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

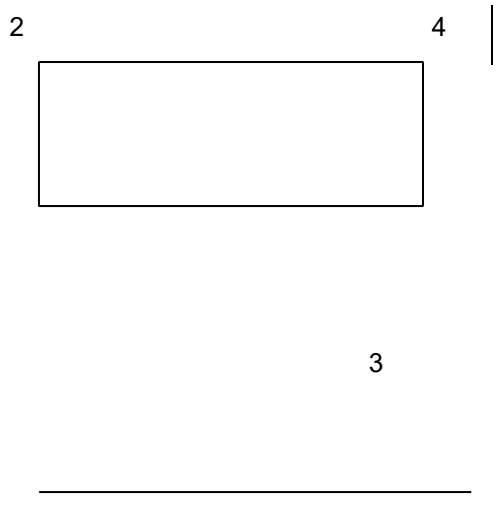

Swedavia	**Datum** **2026/1/19**

Övriga noteringar:

Provad av:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20	
2	20	
3	20	
4	20	
