Sekretess: Intern

BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Centralbyggnaden Incheckningsdisk: 82**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori **Elektronisk**		**Serienr** **1305L10/664**
Fabrikat Flintab	**Modell** **47-10**	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod

Jämförande mätning med verifierade viktnormaler

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0	0	0	
10,0	10	0	10	
20,0	19,7	-0,3	20	
30,0	29,7	-0,3	30	
40,0	39,7	-0,3	40	

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

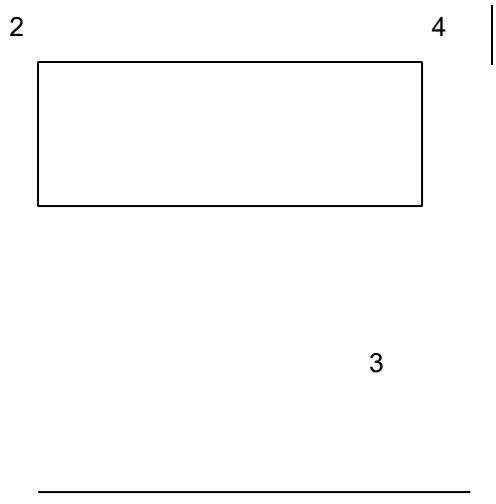

Swedavia	**Datum** **2026/1/19**

Övriga noteringar:

Provad av:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	20	20
2	19,2	20
3	19.9	20
4	19,3	20
